

Карта трудового процесса	Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой с профилировочным ковшом и ковшом с зубьями	Разработана ГП Центрооргтруд Росавтодора
КТП-6.06-2002 (Е2-1-17 (Зд), 89)		Взамен КТ – 0.0

1. Область и эффективность применения карты

1.1. Карта предназначена для рациональной организации труда машиниста экскаватора при разработке навывет грунта групп II и III в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой с профилировочным ковшом и ковшом с зубьями марок: Э-352, Э-304А, 304Б.

1.2. Картой предусмотрена глубина канав до 1 м с разработкой грунта навывет. При устройстве нагорных канав на косогорах грунт в отвал укладывается в виде призмы вдоль канавы с низовой стороны. Рытье канав осуществляется на захватках 400-600 м.

1.3. Показатели производительности труда:

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателей	
			по ЕНиР	по карте
1.	Выработка на 1 чел.-день	м ³	148	157
2.	Затраты труда на разработку 100 м ³ грунта в естественном состоянии	чел.-час	5,4	5,1

Примечание: В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы – 5% и отдых – 10%.

Снижение затрат труда и повышение выработки до 6% достигается за счет сокращения цикла разработки грунта, выбора рациональной захватки и разбивки контура канав.

2. Подготовка и условия выполнения процесса

2.1. Перед началом работ необходимо обеспечить машиниста заданием на выполнение работ.

2.2. Установить вешки по контуру разработки.


2.3. Перед включением двигателя следует провести контроль уровня топлива, масла для двигателя, гидромасла, охлаждающей жидкости, а также плотности соединений.

4.2. График трудового процесса

№ п/п	Наименование операции	В р е м я, мин			Продолжительность, мин	Затраты труда, чел.-мин
		100	200	300		
1.	Установка и приведение агрегата в рабочее положение	_М			5	5
2.	Разработка грунта и очистка ковша		_____М		218	218
3.	Проверка уклона и глубины канавы			— М	11	11
4.	Перемещение экскаватора в процессе работы			— М	15	15
5.	Подготовка и зачистка забоя			— М	18	18
Итого:					267,0	267,0
ПЗР и отдых (15%)						40,0
ВСЕГО на 100 м³:						307,0

4.3. Схема организации трудового процесса

Ось дороги

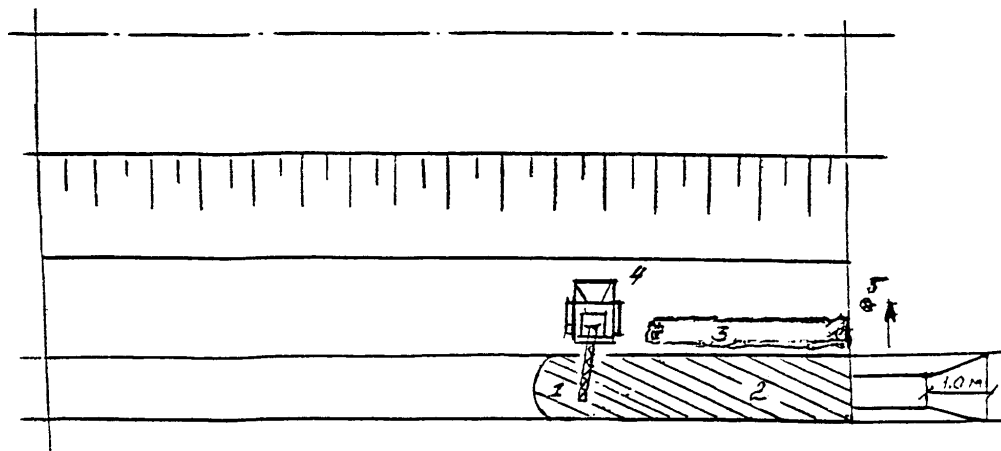

1 – забой; 2 – проходка; 3 – грунт отвала; 4 – экскаватор; 5 – знаки безопасности

5. Приемы труда

№ п/п	Наименование операций	Характеристика приемов труда
1	2	3
1.	Установка экскаватора в забое и приведение агрегата в рабочее положение	Перед установкой экскаватора машинист определяет зону работы экскаватора, ограниченную вылетом рабочего органа и включающая в себя место стояния экскаватора и место отвала грунта.
2.	Разработка грунта навывет и очистка ковша от налипаний грунта	При разработке грунта машинист руководствуется контуром водоотводной канавы, обозначенным колышками по контуру вдоль оси и канавы с указанием глубины в местах их установки, а также заданным заложением откосов и уклоном канавы. При уклонах косогора более 15° устраиваются для перемещения экскаватора траншеи с уклоном в сторону косогора, препятствующие сползанию экскаватора при работе и перемещении.
3.	Проверка уклона и глубины канавы	Проверку заданных геометрических параметров водоотводной канавы и отвала производит машинист перед перемещением экскаватора.
4.	Подготовка и зачистка забоя	Работа выполняется обратной лопатой с планировочным ковшом.

Подписано в печать 10.04.2002 г.
Формат издания 60x84/16. Объем 4 печ. л.
Гарнитура "Times New Roman"
Печать офсетная. Бумага газетная.
Тираж 1 500 экз.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии 4-го филиала Воениздата.
Заказ № 5602

125319, Москва, Большой Коптевский проезд, 16 корп. 2.
